

## 监理通知单

工程名称: 腾冲市幼儿园建设一期项目(二标段)

编号: TCSYFY-2-2021

致: 云南九宫路桥工程有限公司 (施工项目经理部)

事由: 关于现场质量事宜

内容:

贵公司施工的腾冲市幼儿园建设一期项目(二标段)(腾冲市北海乡盈河幼儿园)目前正在进行独立基础地梁短柱安装及模板安装施工,经项目监理部专业监理工程师现场检查发现以下问题:

- 1、目前基础承台及地梁钢筋模板已安装完成,要求施工单位必须把底部泥土全部清理干净,否则不得进行下道工序施工。
- 2、现场基础承台几何尺寸必须满足设计图纸要求,且做好模板支护工作。
- 3、要求施工单位做好现场基础承台地梁防雷接地焊接、链接工作,待基础混凝土浇筑完成后做好防雷接地检测(自检、第三方检测)工作,检测数值必须满足设计要求。在检测过程中必须报请监理单位人员参加。

针对以上问题要求各施工单位对存在问题及时进行整改,在后续施工过程中加强现场管理工作,确保整个工程顺利完工。并于2021年12月14日前整改完成,并回复。

项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字)

2021年12月9日



注: 本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 B.0.9 监理通知回复单

资料号

工程名称:

腾冲市幼儿园建设一期项目(二标段)-腾冲市北海乡盈河幼儿园

致: 云南锦程建设监理咨询有限公司(项目监理机构)

我方接到编号为 TCSYEY-2-2021 的监理通知单后,已按要求完成相关工作,请予以复查。

内容:

1. 基础承台及地梁钢筋模板已安装,已按要求将底部泥土全部清理干净。
2. 经测量现场基础承台几何尺寸满足设计图纸要求,且已经做好模板支护工作。
3. 现场基础承台地梁已完成防雷接地焊接、链接工作,已经进行防雷接地检测后附图片

施工项目经理部(盖章)

项目经理(签字)



2021年12月14日

复查意见:

经监理工程师现场复查,施工单已按要求整改完成

项目监理机构(盖章)

总监理工程师/专业监理工程师(签字)



2021年12月14日

整改前基础承台及地梁模板上泥土


整改后基础承台和地梁模板上的泥土清理干净



基础接地焊接




接地电阻检测

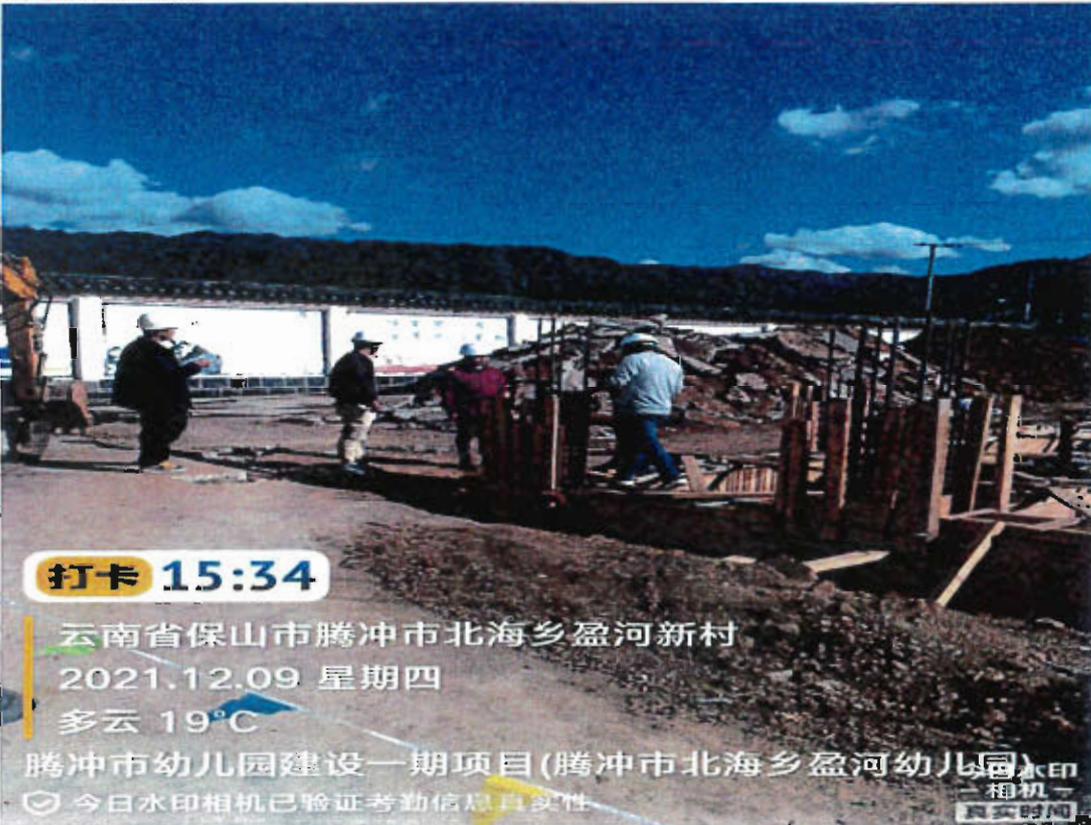

腾冲市幼儿园建设项目一期项目（腾冲市北海乡盈河幼儿园）

项目监理部



现场监理检查验收记录表（回复单）

工程名称：腾冲市幼儿园 建设项目一期项目（腾冲市北海乡盈河幼儿园）	监理单位：云南锦程建设监理咨询有限公司
	施工单位：云南九宫路桥工程有限公司
验收部位：	独立基础承台地梁、短柱钢筋隐蔽验收
<p>1、①~⑦轴交 A 轴圆柱（短柱）箍筋已按设计图纸进行整改，符合要求。</p> <p>2、地梁保护层根据设计要求已重新设置。</p> <p>3、柱筋机械连接丝扣已整改平整。</p> <p>4、在基础承台地梁混凝土浇筑施工前进行浇水湿润。</p>	
监理验收人员：	施工单位质检员： 




检查日期：2021.12.10

第一条整改后

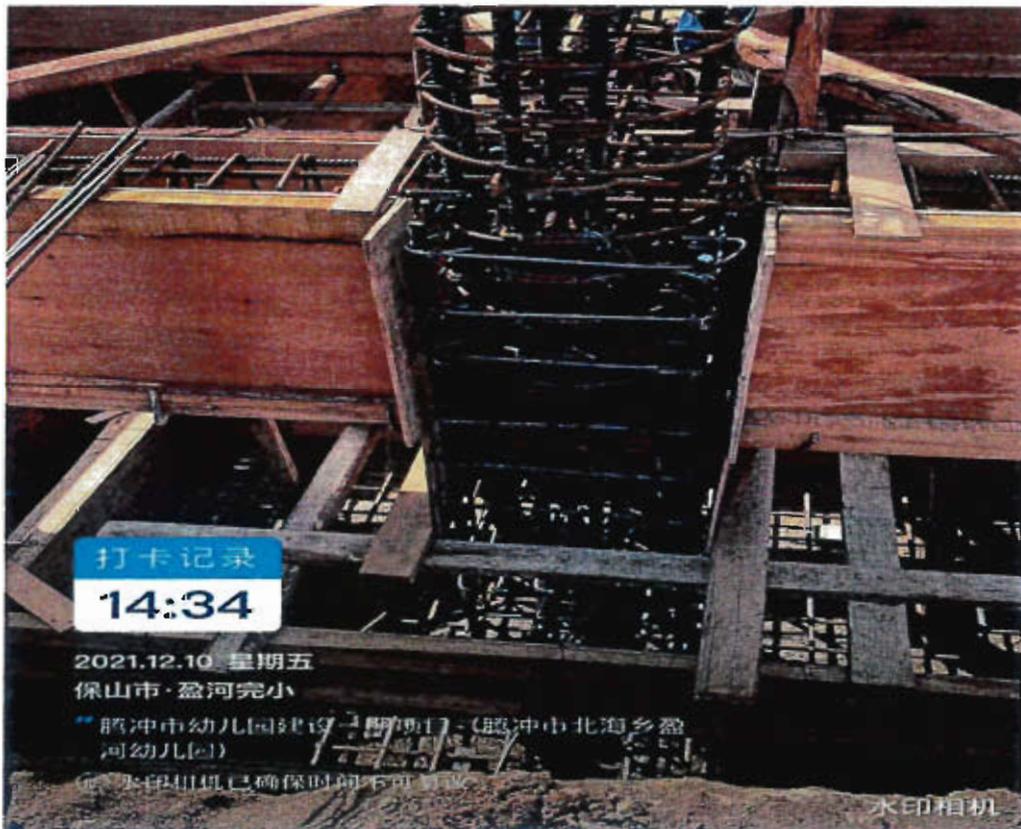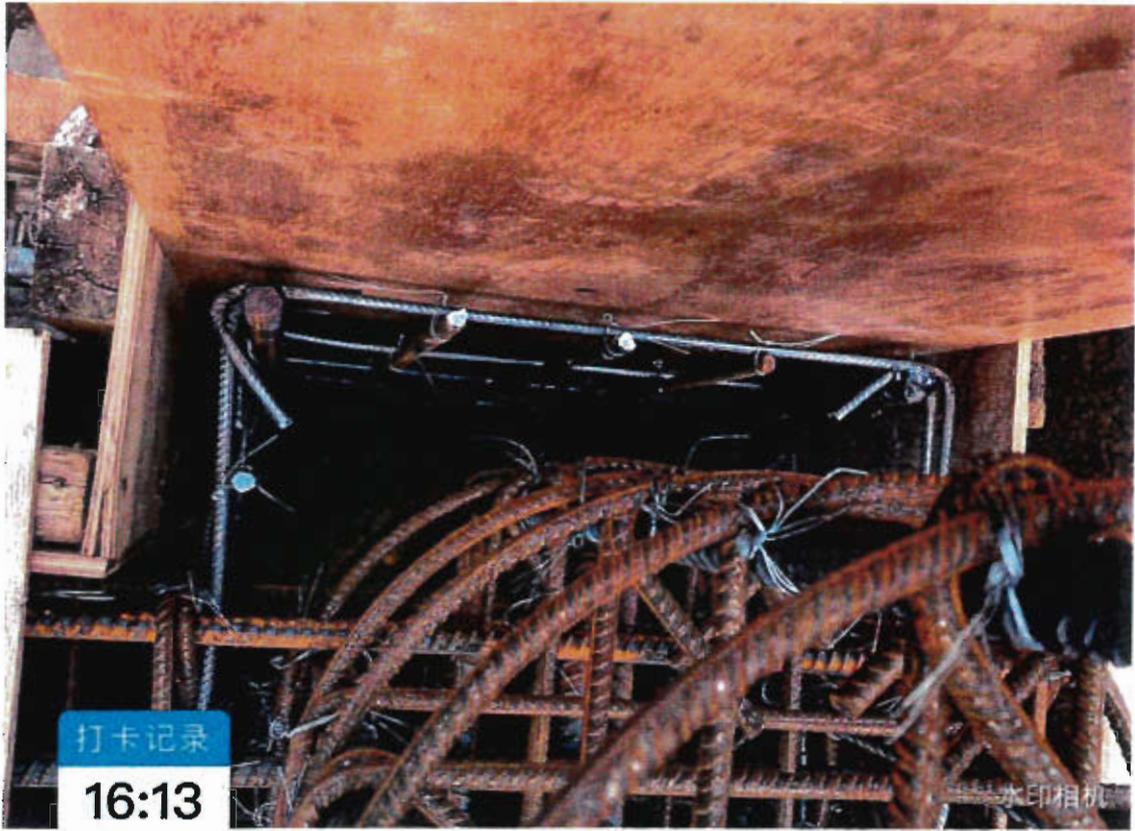

## 第二条整改后



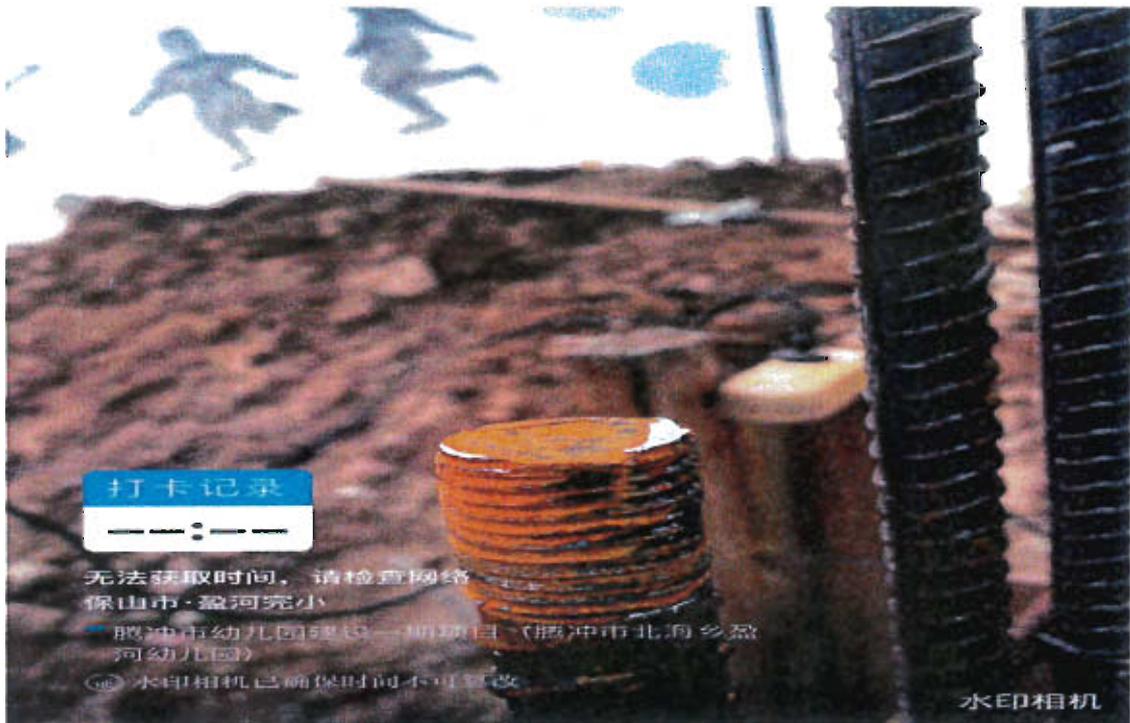

#### 第四条浇筑前进行浇水湿润

